



STATE RAILWAY OF THAILAND

สถานะการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ และทางรถไฟสายใหม่



โครงข่ายทางรถไฟในปัจจุบัน

STATE RAILWAY OF THAILAND




โครงข่ายทางรถไฟ	ความยาว
• สายเหนือ	781 km
• สายตะวันออกเฉียงเหนือ	1,094 km
• สายตะวันออก	534 km
• สายใต้	1,570 km
• สายแม่กลอง	65 km



ทางเดี่ยว 3,764 km. (93.1%)




ทางคู่ 173 km. (4.3%)



สามทาง 107 km. (2.6%)



ปี 2565 จะมีทางคู่เพิ่มขึ้นเป็น 66.5%

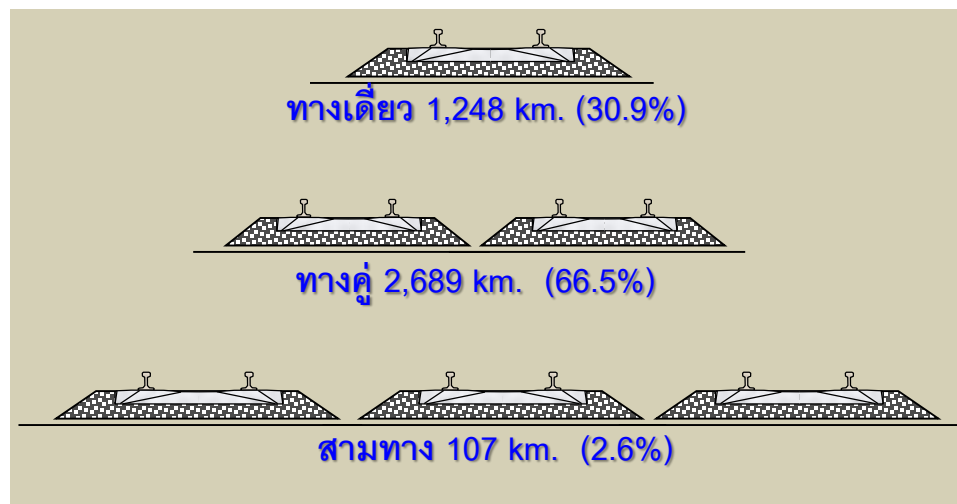



STATE RAILWAY OF THAILAND

ประโยชน์ของโครงการรถไฟทางคู่ต่อผู้ใช้บริการ

1. ลดระยะเวลาการเดินทางได้ 30% เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการรอหลีกขบวนรถ
2. มีความตรงต่อเวลาของขบวนรถ
3. ช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น
4. ลดอุบัติเหตุจากจุดตัดทางผ่านเสมอระดับ โดยการยกเลิกจุดตัดทางผ่านเสมอระดับทางทั้งหมด และก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ ถนนข้ามทางรถไฟ และถนนลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมรั้วสองข้างทางตลอดแนวเส้นทาง



STATE RAILWAY OF THAILAND


ประโยชน์ของโครงการรถไฟทางคู่ต่อประเทศ

1. ลดต้นทุนการขนส่งด้านโลจิสติกส์
2. เพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งทางรถไฟ ลดระยะเวลาการเดินทาง ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งของประเทศ และลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
3. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และท้องถิ่น
4. ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
5. เชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้า และบริการ ทั้งในพื้นที่ชนบท เมือง และระหว่างประเทศเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ



1. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

STATE RAILWAY OF THAILAND

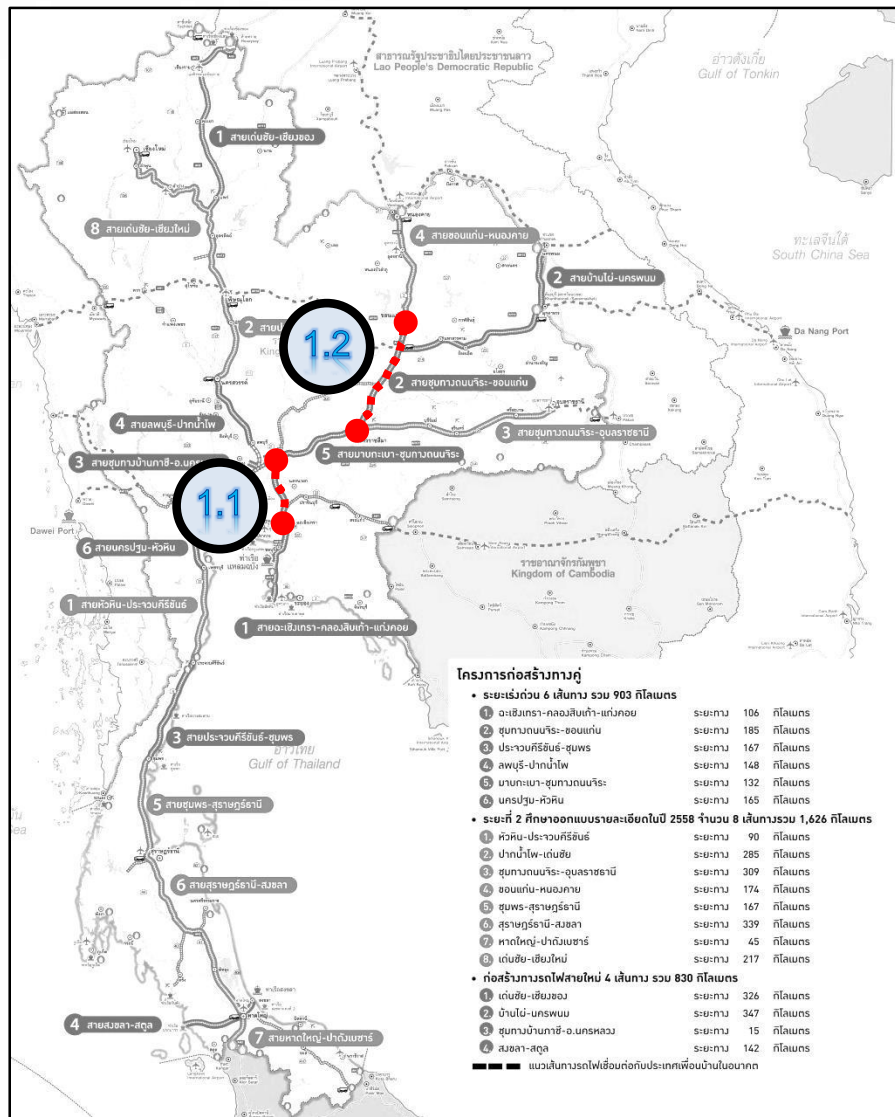

1.1 ช่วงช่วงจะเข้-เชิงเทรา - แก่งคอย

1.2 ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น



STATE RAILWAY OF THAILAND

1. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

1.1 ช่วงจะเข้เชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย



ระยะทาง : 106 กิโลเมตร

วงเงินรวม : 10,549.97 ล้านบาท

สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ความก้าวหน้า สัญญา 1: 0.80%
ความก้าวหน้า สัญญา 2: 0.85%

ผู้รับจ้าง : สัญญา 1 : บริษัท ชีโน-ไทย
สัญญา 2 : บริษัท ไรท์ทันเนิลลิงฯ

ระยะเวลา : 36 เดือน
19 ก.พ. 59 - 18 ก.พ. 62



STATE RAILWAY OF THAILAND

1.2 ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น


ระยะทาง : 185 กิโลเมตร

วงเงินรวม : 24,075.90 ล้านบาท

สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ความก้าวหน้า 1.53%

ผู้รับจ้าง : กิจการร่วมค้า ซีเคซีเอช


ระยะเวลา : 36 เดือน
19 ก.พ. 59 - 18 ก.พ. 62

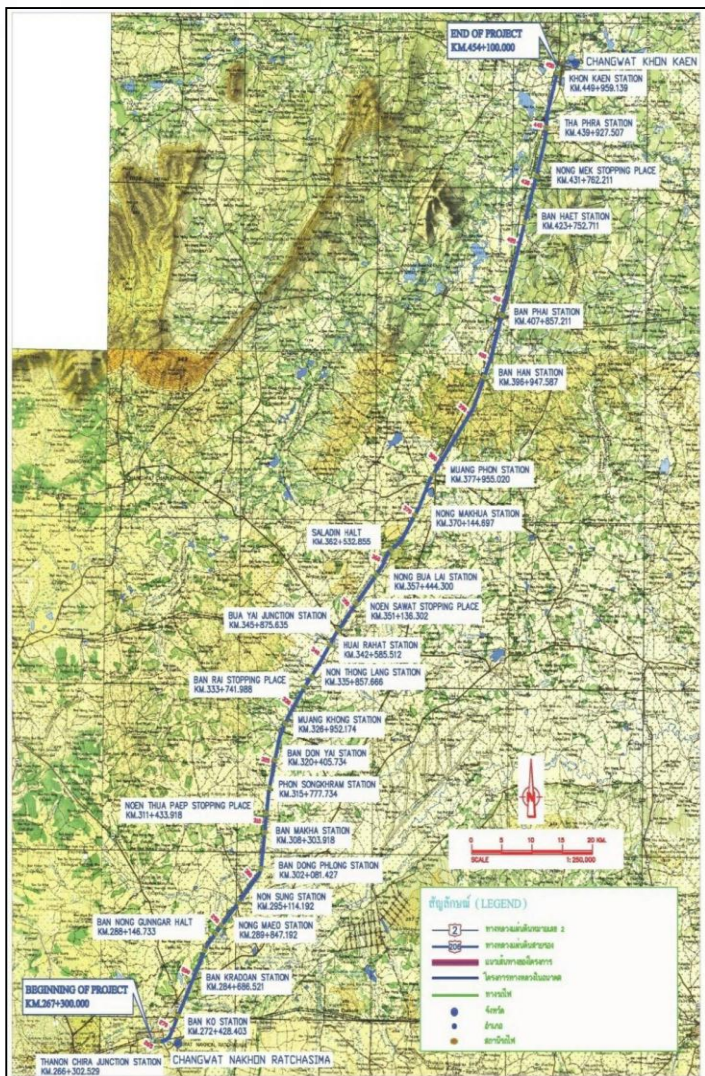



2. โครงการที่อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ ครม.

STATE RAILWAY OF THAILAND

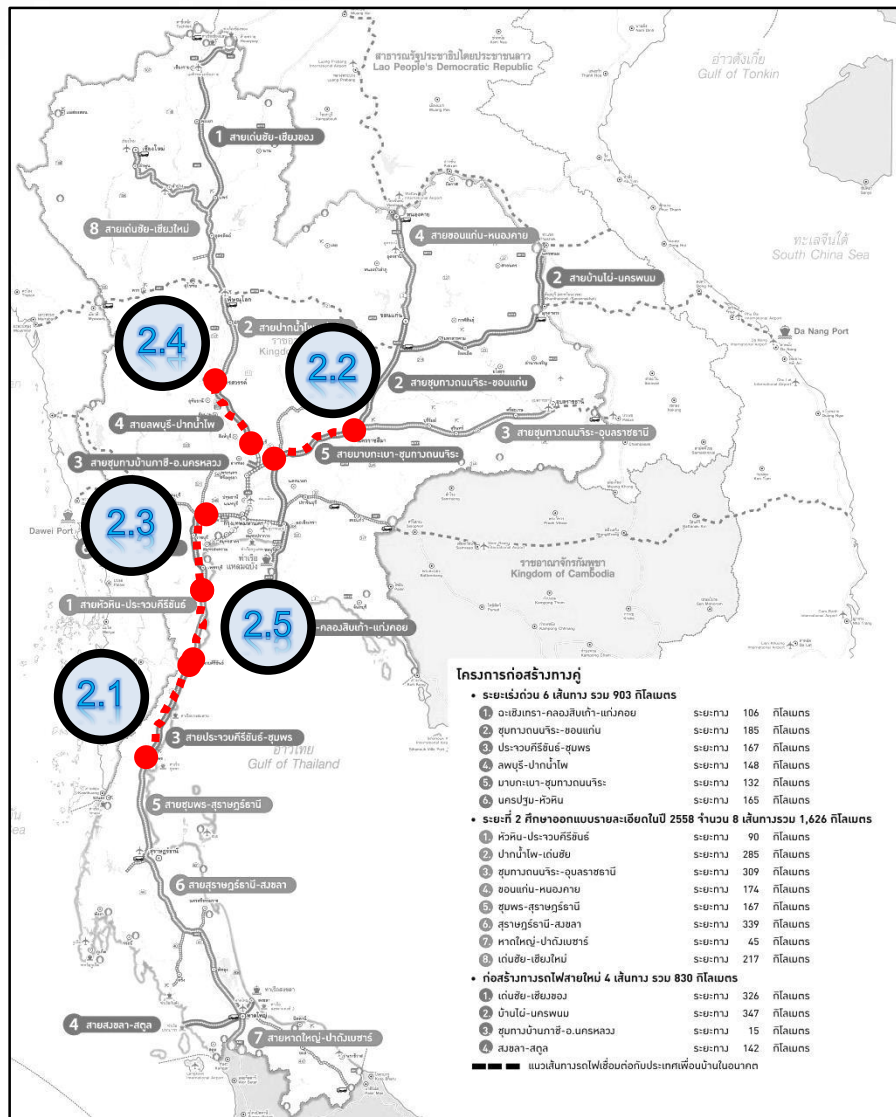

2.1 ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร

2.2 ช่วงมาบตาพาด - ชุมทางถนนจิระ

2.3 ช่วงนครปฐม - หัวหิน

2.4 ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ

2.5 ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์



STATE RAILWAY OF THAILAND



2.1 ช่วงประจวบคิรีขันธ์ - ชุมพร

ระยะทาง : 167 กิโลเมตร

วงเงินรวม : 17,249.90 ล้านบาท

สถานะปัจจุบัน : ครม. อนุมัติโครงการ 26 เม.ย.59
เตรียมการประกวดราคา

เป้าหมาย : ประมวลราคา มิ.ย. 59
ลงนามสัญญา ต.ค. 59
ก่อสร้าง 36 เดือน



2. โครงการที่อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ ครม.

STATE RAILWAY OF THAILAND



2.2 ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิริระ

ระยะทาง : 132 กิโลเมตร

วงเงินรวม : 29,667.66 ล้านบาท

สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างเสนอ ครม. อนุมัติ
(อยู่ระหว่าง สศช. พิจารณา)

เป้าหมาย : ครม. อนุมัติ มิ.ย. 59

ประกวดราคา ก.ค. 59


ลงนามสัญญา พ.ย. 59

ก่อสร้าง 48 เดือน



2. โครงการที่อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ ครม.

STATE RAILWAY OF THAILAND

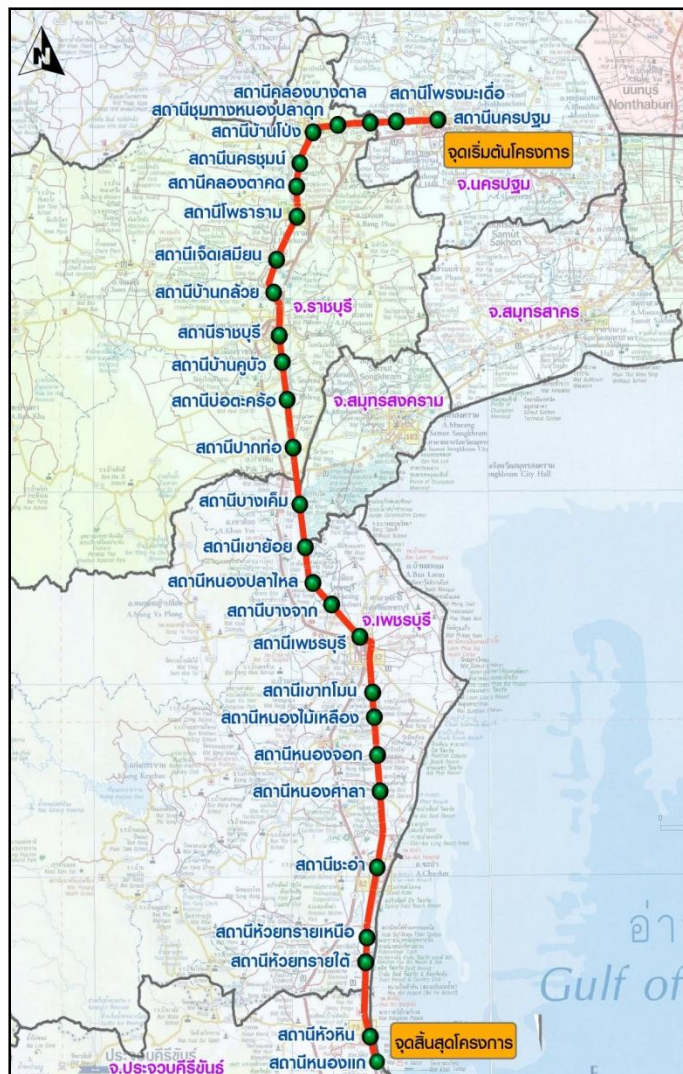

2.4 ช่วงนครปฐม - หัวหิน

ระยะทาง : 165 กิโลเมตร

วงเงินรวม : 20,145.03 ล้านบาท

สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างเสนอ ครม. อนุมัติ
(อยู่ระหว่าง กก.วล. กำหนดวัน
ประชุมเพื่อพิจารณา EIA)

เป้าหมาย : ครม. อนุมัติ ก.ค. 59

ประกวดราคา ส.ค. 59

ลงนามสัญญา ธ.ค. 59

ก่อสร้าง 36 เดือน



2. โครงการที่อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ ครม.

STATE RAILWAY OF THAILAND

2.3 ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ



ระยะทาง : 148 กิโลเมตร

วงเงินรวม : 24,940.96 ล้านบาท

สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างเสนอ ครม. อนุมัติ
(อยู่ระหว่าง กก.วล. กำหนด
วันประชุมเพื่อพิจารณา EIA)

เป้าหมาย : ครม. อนุมัติ ก.ค. 59

ประกวดราคา ส.ค. 59


ลงนามสัญญา ธ.ค. 59

ก่อสร้าง 48 เดือน



2. โครงการที่อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ ครม.

STATE RAILWAY OF THAILAND

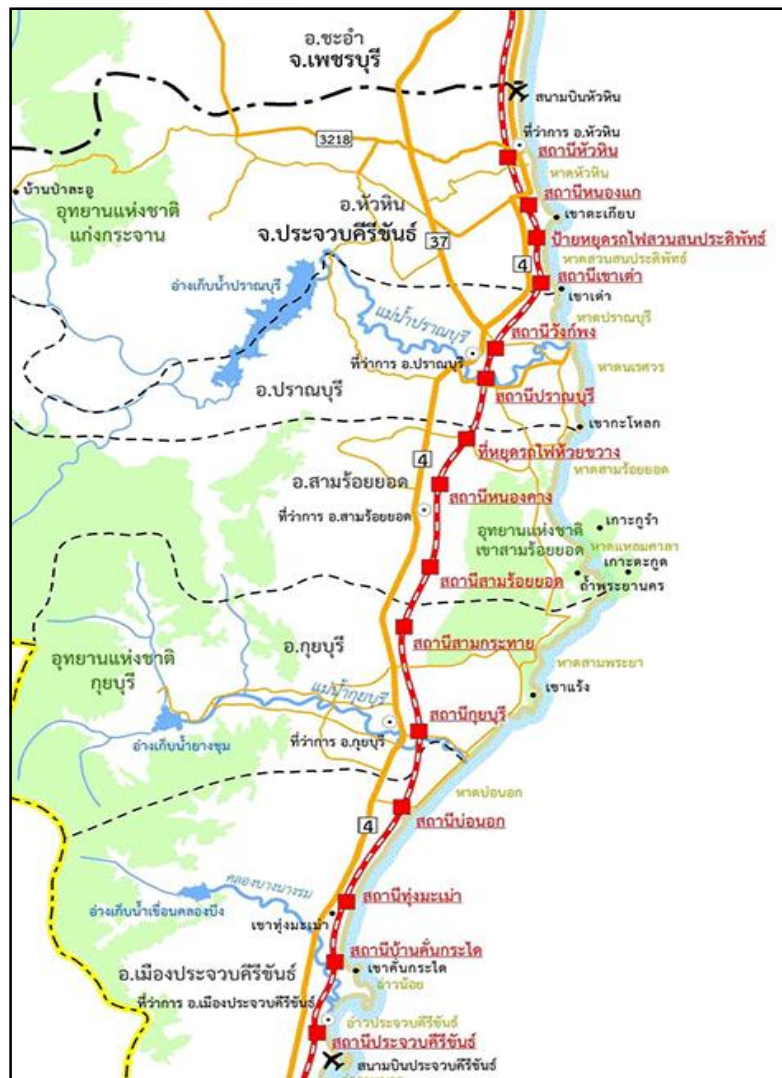

2.5 ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์

ระยะทาง : 90 กิโลเมตร

วงเงินรวม : 10,301.15 ล้านบาท

สถานะปัจจุบัน: อยู่ระหว่างเสนอ ครม. อนุมัติ
(อยู่ระหว่าง คค. พิจารณา)

เป้าหมาย : ครม. อนุมัติ ส.ค. 59
ประกวดราคา พ.ย. 59
ลงนามสัญญา มี.ค. 60
ก่อสร้าง 30 เดือน



3.1 ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย

3.2 ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี

3.3 ช่วงขอนแก่น - หนองคาย

3.4 ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี

3.5 ช่วงสุรษฏ์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา

3.6 ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่

3.7 ช่วงชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์





3. โครงการที่อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียด

STATE RAILWAY OF THAILAND

3.1 ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย

ระยะทาง : 285 กิโลเมตร

วงเงินรวม : 64,921.04 ล้านบาท

สถานะปัจจุบัน: ศึกษาและออกแบบ

เป้าหมาย : ศึกษาและออกแบบ พ.ศ.59
กรม. อนุมัติ พ.ย. 59

ประกวดราคา ก.พ. 60

ลงนามสัญญา มิ.ย. 60

ก่อสร้าง 48 เดือน



3. โครงการที่อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียด

STATE RAILWAY OF THAILAND

3.2 ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี

ระยะทาง :	309 กิโลเมตร
วงเงินรวม :	49,951.12 ล้านบาท
สถานะปัจจุบัน:	ศึกษาและออกแบบ
เป้าหมาย :	ศึกษาและออกแบบ พ.ค.59 กรม. อนุมัติ พ.ย. 59 ประกวดราคา ก.พ. 60 ลงนามสัญญา มิ.ย. 60 ก่อสร้าง 36 เดือน





3. โครงการที่อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียด

STATE RAILWAY OF THAILAND




3.3 ช่วงขอนแก่น - หนองคาย

ระยะทาง :	174 กิโลเมตร
วงเงินรวม :	23,727.32 ล้านบาท
สถานะปัจจุบัน:	ศึกษาและออกแบบ
เป้าหมาย :	ศึกษาและออกแบบ พ.ค.59 กรม. อนุมัติ พ.ย. 59 ประกวดราคา ก.พ. 60 ลงนามสัญญา มิ.ย. 60 ก่อสร้าง 36 เดือน



3. โครงการที่อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียด

STATE RAILWAY OF THAILAND

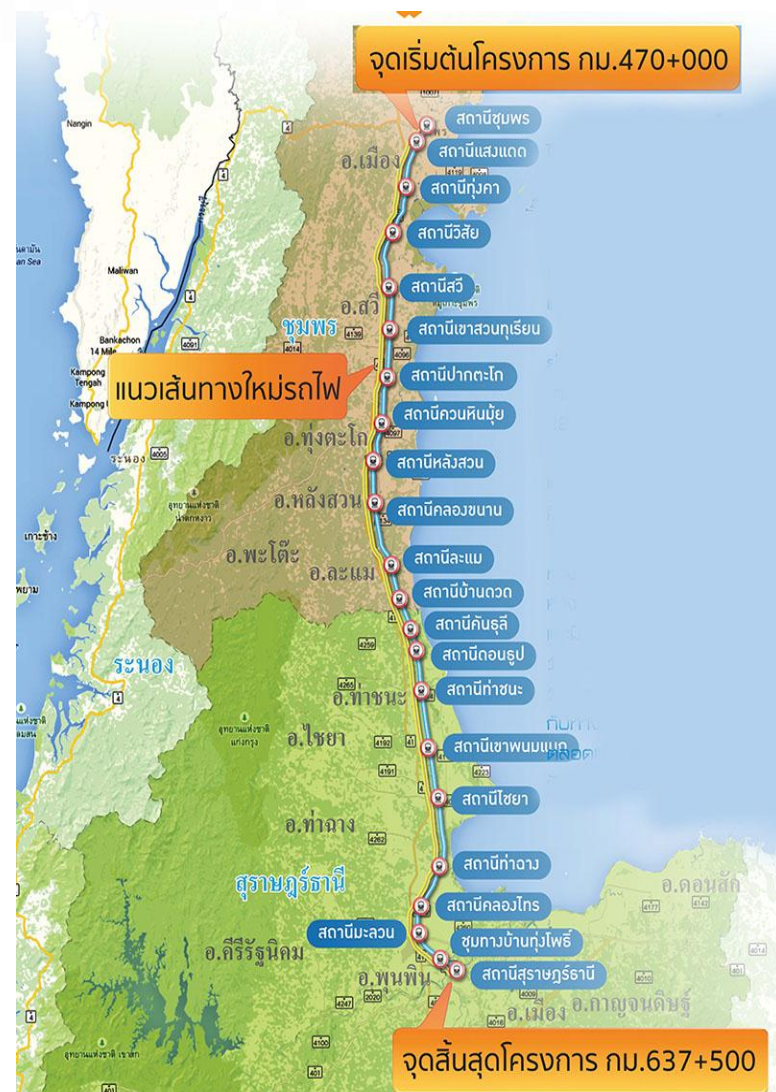


3.4 ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี

ระยะทาง :	167 กิโลเมตร
วงเงินรวม :	34,726.34 ล้านบาท
สถานะปัจจุบัน:	ศึกษาและออกแบบ
เป้าหมาย :	ศึกษาและออกแบบ พ.ศ.59 กรม. อนุมัติ พ.ย. 59 ประกวดราคา ก.พ. 60 ลงนามสัญญา มิ.ย. 60 ก่อสร้าง 36 เดือน



3. โครงการที่อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียด

STATE RAILWAY OF THAILAND

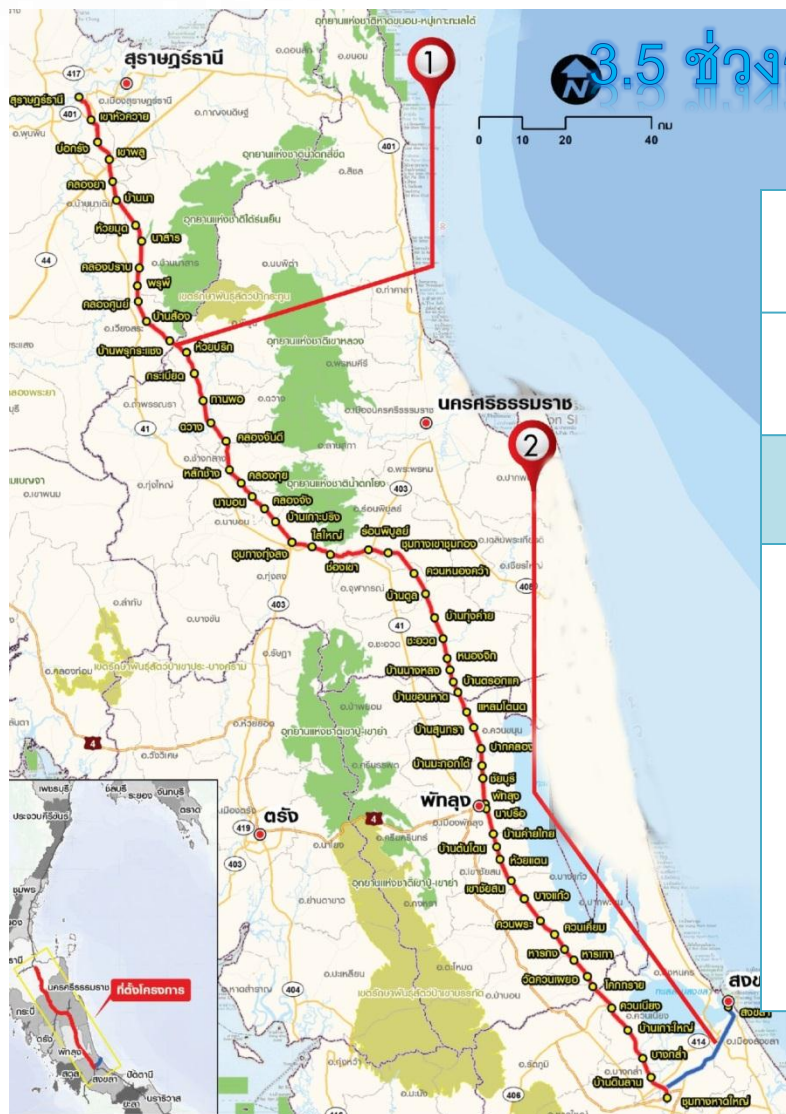

3.5 ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา

ระยะทาง : 324 กิโลเมตร

วงเงินรวม : 51,065.37 ล้านบาท

สถานะปัจจุบัน: ศึกษาและออกแบบ

เป้าหมาย : ศึกษาและออกแบบ ส.ค.59
กรม. อนุมัติ ก.พ. 60
ประกวดราคา พ.ค. 60
ลงนามสัญญา ก.ย. 60
ก่อสร้าง 48 เดือน



STATE RAILWAY OF THAILAND

3.6 ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่

ระยะทาง :	189	กิโลเมตร
วงเงินรวม :	63,353.86	ล้านบาท
สถานะปัจจุบัน:	ศึกษาและออกแบบ	
เป้าหมาย :	ศึกษาและออกแบบ พ.ค.59 ครม. อนุมัติ พ.ย. 59 ประกวดราคา ก.พ. 60 ลงนามสัญญา มิ.ย. 60 ก่อสร้าง 48 เดือน	






3. โครงการที่อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียด

STATE RAILWAY OF THAILAND

3.7 ช่วงชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์

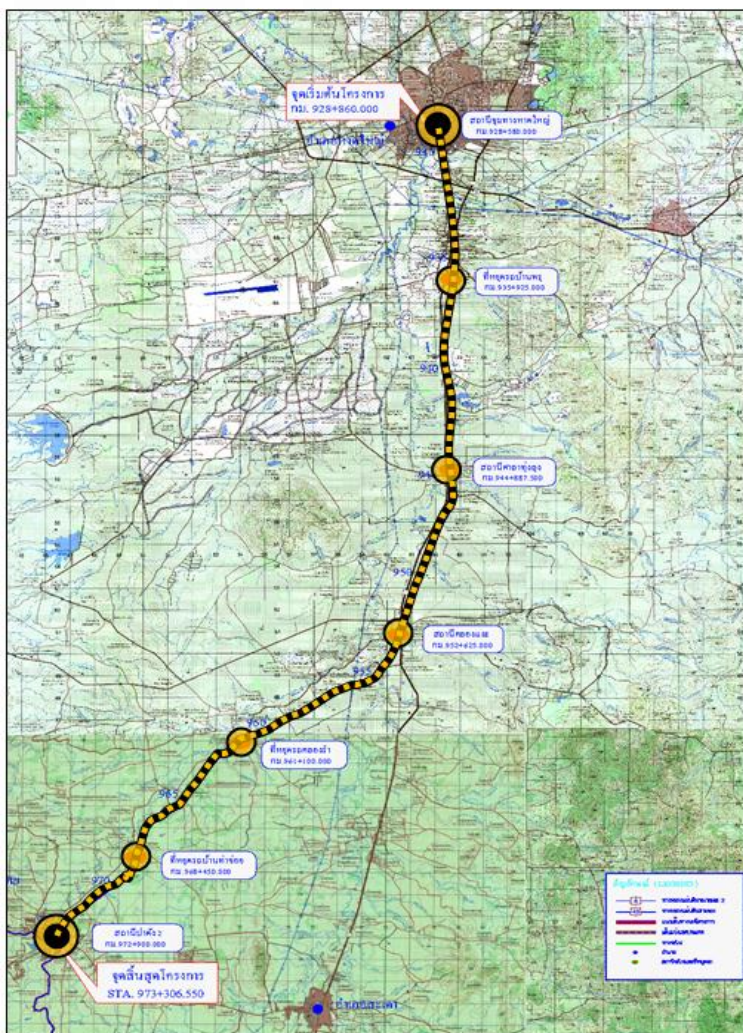

ระยะทาง : 45 กิโลเมตร

วงเงินรวม : 9,078.12 ล้านบาท

สถานะปัจจุบัน: ศึกษาและออกแบบ

เป้าหมาย : ศึกษาและออกแบบ พ.ศ.59
กรม. อนุมัติ พ.ย. 59
ประกวดราคา ก.พ. 60
ลงนามสัญญา มิ.ย. 60
ก่อสร้าง 24 เดือน




4. โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่

STATE RAILWAY OF THAILAND

4.1 สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ

4.2 สายบ้านไผ่ - มุกดาหาร - นครพนม

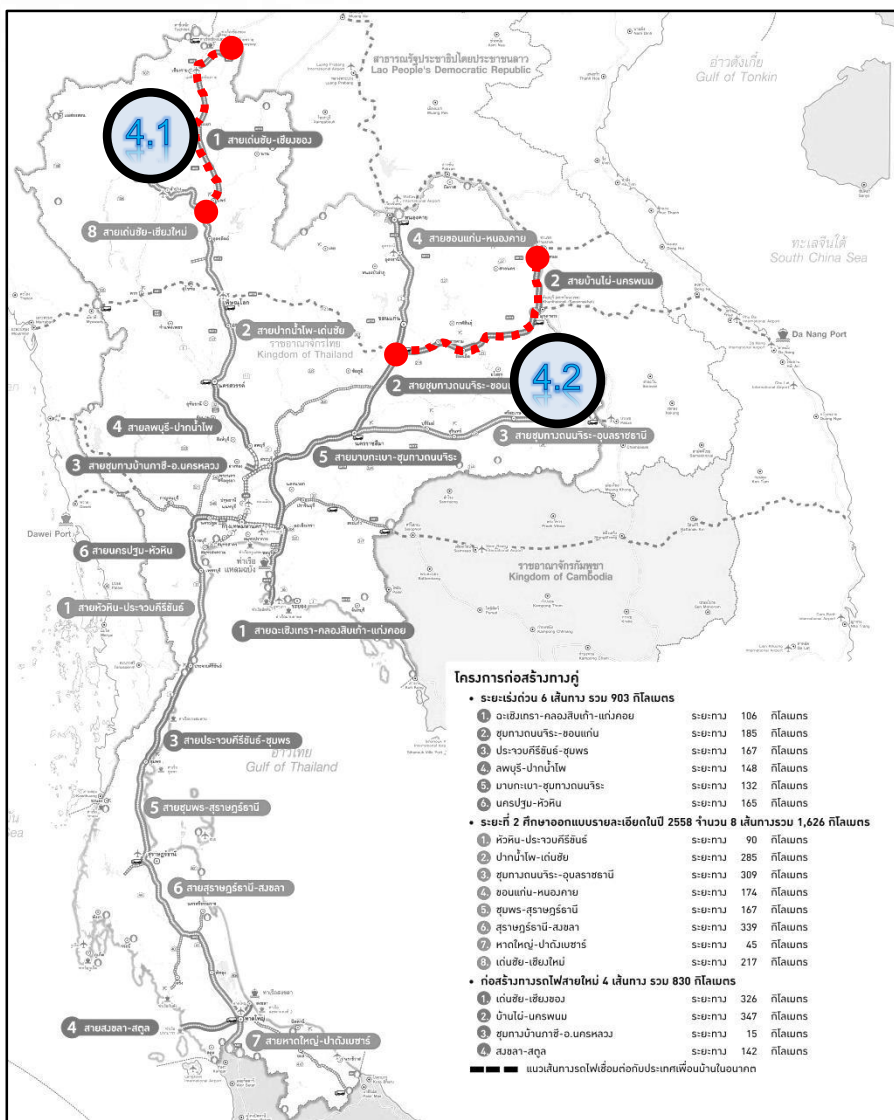



สถานะปัจจุบัน : เสนอ กรม. อนุมัติ

อยู่ระหว่าง รฟท. เตรียมเสนอ กรม. ขออนุมัติโครงการ
อยู่ระหว่าง คชก. กำหนดวันประชุมเพื่อพิจารณา
รายงาน EIA

วงเงินรวม : 77,485.64 ล้านบาท

ระยะทาง : 326 กิโลเมตร

เป้าหมาย : ครม. อนุมัติ ก.ย. 59

ประกวดราคา ธ.ค. 59

ลงนามสัญญา เม.ย. 60

ก่อสร้าง 48 เดือน



4. โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่

STATE RAILWAY OF THAILAND

4.2 สายบ้านไผ่ - มุกดาหาร - นครพนม

สถานะปัจจุบัน : เสนอ ครม. อนุมัติ

อยู่ระหว่าง รฟท. เตรียมเสนอ ครม. ขออนุมัติโครงการ
อยู่ระหว่าง คชก. กำหนดวันประชุมเพื่อพิจารณา
รายงาน EIA

วงเงินรวม : 60,715.46 ล้านบาท

ระยะทาง : 355 กิโลเมตร

เป้าหมาย : ครม. อนุมัติ ก.ย. 59
ประกวดราคา ธ.ค. 59
ลงนามสัญญา เม.ย. 60
ก่อสร้าง 48 เดือน



สถานะการดำเนินงาน
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่และทางรถไฟสายใหม่

แบบ ศส.1

ข้อมูล ณ 6 มิถุนายน 2559

โครงการ	ระยะทาง (กิโลเมตร)	กรอบวงเงิน โครงการ (ล้านบาท)	ค่าก่อสร้าง (ล้านบาท)	FS/OD	EIA	สศท.	คท.	พยุ.ฉบับต้น แบบ	พยุ.ฉบับ แก้ไข	ประกาศ ใช้	ก่อสร้าง	สถานะปัจจุบัน	รายละเอียด	เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1																
1 ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย สัญญา 1 (ผู้รับจ้าง บริษัท ซีโน-ไทยฯ) สัญญา 2 (ผู้รับจ้าง บริษัท ไร่หินเน็ลลิงฯ)	106 97 9	11,348.35	10,232.86 9,825.81 407.05	✓	✓	✓	✓	✓	๑	✓	๑	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	□ สัญญา 1 ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน เริ่ม 19 ก.พ. 59 ความก้าวหน้า 0.80% สัญญา 2 ระยะเวลาก่อสร้าง 25 เดือน เริ่ม 19 ก.พ. 59 ความก้าวหน้า 0.85% งานเวนคืนที่ดินอยู่ระหว่างกำหนดราคาเบื้องต้นทางเลี้ยวเมืองชุมทางบ้านภาชี แก่งคอย และเรียกทำสัญญารับเงินค่าทดแทน ฉะเชิงเทรา	□ ก่อสร้างเสร็จ ก.พ. 62 ก่อสร้างเสร็จ เม.ย. 61	-	นายธีระ รุ่งโรจน์สุวรรณ โทร 095-3709288
2 ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น (ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ซีเคซีเอช)	187	26,007.20	23,430.00	✓	✓	✓	✓	✓	๑	✓	๑	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน เริ่ม 19 ก.พ. 59 ความก้าวหน้า 1.53% งานเวนคืนที่ดินอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจปริมาณงานในการจ่ายเงินค่าทดแทน	ก่อสร้างเสร็จ ก.พ. 62	-	นายณฐพนธ์ สุขวิทยุญา โทร 095-1670878
3 ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร	167	17,290.63	16,704.70	✓	✓	✓	✓	✓	๑	๑		ประกาศราคา	คท. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 59 จัดทำร่าง TOR และราคากลางแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมประกาศร่าง TOR ลงเว็บไซต์ พรฎ.ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 59	ประกาศราคา พ.ค. 59 ลงนามสัญญา ต.ค. 59	-	นายพุดตินัย เลื่อนนักรับ โทร 095-3709287
4 ช่วงมาบตาพาด - ชุมทางถนนจิระ	132	29,853.18	28,991.81	✓		๑		๑				เสนอ คท. อนุมัติ	บอร์ต สศท. เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 59 และคาดว่า คท. จะอนุมัติภายใน มิ.ย. 59 รฟท. อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และราคากลาง งานเวนคืนที่ดินอยู่ระหว่างกฤษฎีกาตรวจสอบ	ประกาศราคา ก.ค. 59 ลงนามสัญญา พ.ย. 59	-	นายณฐพนธ์ สุขวิทยุญา โทร 095-1670878
5 ช่วงนครปฐม - หัวหิน	165	20,145.03	19,370.32	✓	๑	๑		๑				เสนอ คท. อนุมัติ	รฟท. เสนอ คท. ขออนุมัติโครงการ เมื่อ 5 เม.ย. 59 และส่งข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อ 11 พ.ค. 59 อยู่ระหว่าง กก.วล. กำหนดวันประชุมเพื่อพิจารณารายงาน EIA (สนข. ส่งรายงาน EIA (ฉบับแก้ไข) เมื่อ 12 ก.พ. 59) รฟท. อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และราคากลาง พรฎ.ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 59	คท.อนุมัติ ก.ค. 59 ประกาศราคา ส.ค. 59 ลงนามสัญญา ต.ค. 59	-	นายธีระ รุ่งโรจน์สุวรรณ โทร 095-3709288
6 ช่วงสทพวรี - ปากน้ำโพ	148	24,940.96	24,212.49	✓	๑	๑		✓	๑			เสนอ คท. อนุมัติ	รฟท. เสนอ คท. ขออนุมัติโครงการ เมื่อ 5 เม.ย. 59 และส่งข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อ 11 พ.ค. 59 อยู่ระหว่าง กก.วล. กำหนดวันประชุมเพื่อพิจารณารายงาน EIA (สนข. ส่งรายงาน EIA (ฉบับแก้ไข) เมื่อ 12 ก.พ. 59) รฟท. อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และราคากลาง งานเวนคืนที่ดินอยู่ระหว่างจ้างที่ปรึกษาสำรวจปริมาณงาน	คท.อนุมัติ ก.ค. 59 ประกาศราคา ส.ค. 59 ลงนามสัญญา ต.ค. 59	-	นายไชยา วงศ์สิทธิพรรุ่ง โทร 095-1670816 นายกฤษฎา มัชฌิมภาโร โทร 085-9331877
7 ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์	90	10,301.95	9,968.21	✓	๑	๑						เสนอ คท. อนุมัติ	รฟท. เสนอ คท. ขออนุมัติโครงการ เมื่อ 5 เม.ย. 59 และส่งข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อ 11 พ.ค. 59 รฟท. อยู่ระหว่างจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา รฟท. จัดส่งรายงาน EIA ให้ สท. เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 59	คท.อนุมัติ ส.ค. 59 ประกาศราคา พ.ย. 59 ลงนามสัญญา มิ.ค. 60	-	นายพุดตินัย เลื่อนนักรับ โทร 095-3709287
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2																
8 ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย	285	57,094.74	52,321.96	๑								ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ รายละเอียด	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เมื่อ 12 เม.ย. 59 และตรวจรับเมื่อ 3 พ.ค. 59	ออกแบบเสร็จ พ.ค. 59	-	นายปฐพงศ์ บุญแก้ว โทร 095-3709282
9 ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี	309	36,015.35	35,122.70	๑									ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เมื่อ 12 เม.ย. 59 อยู่ระหว่างกำหนดวันตรวจรับ	ออกแบบเสร็จ พ.ค. 59	-	นายปฐพงศ์ บุญแก้ว โทร 095-3709282
10 ช่วงขอนแก่น - หนองคาย	174	26,480.65	24,780.00	๑									ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เมื่อ 12 เม.ย. 59 และตรวจรับเมื่อ 28 เม.ย. 59	ออกแบบเสร็จ พ.ค. 59	-	นายปฐพงศ์ บุญแก้ว โทร 095-3709282
11 ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี	167	23,402.70	22,147.80	๑									ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เมื่อ 12 เม.ย. 59 อยู่ระหว่างกำหนดวันตรวจรับ	ออกแบบเสร็จ พ.ค. 59	-	นายปฐพงศ์ บุญแก้ว โทร 095-3709282
12 ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา	324	74,985.00	72,123.00	๑									ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 (Progress Report) เมื่อ 2 เม.ย. 59 และตรวจรับเมื่อ 8 เม.ย. 59	ออกแบบเสร็จ ส.ค. 59	-	นายปฐพงศ์ บุญแก้ว โทร 095-3709282
13 ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ (สนข. ออกแบบ)	189	61,093.14	57,992.44	๑								ออกแบบโดย สนข.	อยู่ระหว่างศึกษาและออกแบบรายละเอียด	ออกแบบเสร็จ พ.ค. 59	-	นายปฐพงศ์ บุญแก้ว โทร 095-3709282
14 ช่วงชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ (สนข. ออกแบบ)	45	13,271.21	7,651.50	✓	๑							พิจารณา EIA	ออกแบบแล้วเสร็จเมื่อ 2 ธ.ค. 58 อยู่ระหว่างเสนอรายงาน EIA คาดว่าจะส่งภายใน มิ.ย. 59	-	-	นายปฐพงศ์ บุญแก้ว โทร 095-3709282
โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่																
15 สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ	326	76,980.32	71,696.00	✓	๑							เสนอ คท. อนุมัติ	อยู่ระหว่าง รฟท. เตรียมเสนอ คท. ขออนุมัติโครงการ (เข้าบอร์ด รฟท. 12 เม.ย. 59) อยู่ระหว่าง คท. กำหนดวันประชุมเพื่อพิจารณารายงาน EIA (รฟท. ส่งรายงาน EIA (ฉบับแก้ไข) เมื่อ 3 มิ.ย. 58)	-	-	นายไชยา วงศ์สิทธิพรรุ่ง โทร 095-1670816
16 สายบ้านไผ่ - มุกดาหาร - นครพนม	355	60,353.41	54,226.86	✓	๑							เสนอ คท. อนุมัติ	อยู่ระหว่าง รฟท. เตรียมเสนอ คท. ขออนุมัติโครงการ (เข้าบอร์ด รฟท. 12 เม.ย. 59) อยู่ระหว่าง คท. กำหนดวันประชุมเพื่อพิจารณารายงาน EIA (รฟท. ส่งรายงาน EIA (ฉบับแก้ไข) เมื่อ 3 มิ.ย. 58)	-	-	นายไชยา วงศ์สิทธิพรรุ่ง โทร 095-1670816

หมายเหตุ : โครงการลำดับที่ 5 6 7 15 และ 16 ดำเนินการขออนุมัติโครงการคู่ขนานกับการพิจารณาเห็นชอบรายงาน EIA (ปฏิบัติตามคำสั่ง ศสท. ที่ 9/2559 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559)

ศูนย์โครงการก่อสร้าง ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-220-4764

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา - แก่งคอย

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน		ระยะเวลา (เดือน)	ปีงบประมาณ 2559											ปีงบประมาณ 2560											ปีงบประมาณ 2561					ปีงบประมาณ 2562							
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	ตค 59	พย 59	ธค 59	มค 60	กพ 60	มีค 60	เมย 60	พค 60	มิย 60	กค 60	สค 60	กย 60											
1	สำรวจและประเมินราคา	9																																			
2	เวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	9																																			
3	ประกวดราคาสัญญา 1 และสัญญา 2	5																																			
4	ก่อสร้างงานสัญญา 1	36																																			
5	ก่อสร้างงานสัญญา 2	25																																			

แผนการเบิกจ่ายเงิน

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562		
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย				
1	ค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	21.37	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา (ส่วนที่เหลือ)	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ค่าก่อสร้างสัญญา 1	9,825.81	0.00	0.00	0.00	0.00	982.58	0.00	0.00	61.88	46.71	50.58	98.92	101.57	104.00	105.77	106.83	107.71	108.62	150.44	211.33	225.01	250.04	324.15	368.37	376.33	4,670.75		1,374.22
4	ค่าก่อสร้างสัญญา 2	407.05	0.00	0.00	0.00	0.00	40.70	0.00	0.00	0.84	3.55	6.67	10.04	12.53	17.25	16.30	23.92	14.18	23.70	36.93	40.88	40.22	31.84	15.86	8.39	6.23	57.00		0.00
5	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง	312.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.24	0.00	22.26	7.42	7.42	7.42	7.42	7.42	7.42	7.42	7.42	7.42	7.42	7.42	7.42	7.42	7.42	7.42	89.02		65.99
แผนการเบิกจ่ายเงิน		10,678.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.28	0.00	4.38	93.96	50.64	90.18	127.06	132.20	139.35	140.17	148.85	139.99	161.11	205.46	270.31	283.34	289.29	347.43	384.18	389.97	4,816.78		1,440.21
แผนการเบิกจ่ายเงินสะสม		-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.28	1,023.28	1,027.66	1,121.62	1,172.26	1,262.44	1,389.49	1,521.70	1,661.05	1,801.22	1,950.07	2,090.05	2,251.16	2,456.62	2,726.94	3,010.27	3,299.57	3,647.00	4,031.18	4,421.15	9,237.93		10,678.14

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น

ขั้นตอนการดำเนินงาน		ระยะเวลา (เดือน)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561			ปีงบประมาณ 2562						
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย										
			58	58	58	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	60	60	60	60	60	60	60	60	60									
1	สำรวจและประเมินราคา	9																																		
2	เวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6																																		
3	ประกวดราคา	5																																		
4	ก่อสร้าง	36																																		

รายการ		จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	
			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
1	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจสิ่งทรมทรัพย์เพื่อเวนคืน	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.80	0.80	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา	7.70	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	0.00	4.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ค่าก่อสร้าง	23,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.85	198.22	702.20	740.15	381.67	508.20	569.35	651.59	742.26	788.65	995.31	972.11	1,033.26	1,064.89	1,035.37	9,234.00	1,433.92	
5	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20	0.00	33.65	11.22	11.22	11.22	11.22	11.22	11.22	11.22	11.22	11.22	11.22	11.22	11.22	11.22	11.22	158.55	129.553	
แผนการเบิกจ่ายเงิน		24,075.90	0.00	0.00	0.00	2.92	2,343.00	0.00	4.39	55.59	1.19	70.30	209.64	738.91	766.67	408.19	534.71	595.87	678.11	753.48	799.87	1,006.52	983.33	1,044.48	1,076.11	1,046.59	9,392.55	1,563.47	
แผนการเบิกจ่ายเงินสะสม		-	0.00	0.00	0.00	2.92	2,345.92	2,345.92	2,350.31	2,405.90	2,407.09	2,477.39	2,687.03	3,425.95	4,192.62	4,600.81	5,135.52	5,731.39	6,409.50	7,162.97	7,962.85	8,969.37	9,952.70	10,997.18	12,073.29	13,119.88	22,512.43	24,075.90	

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (เดือน)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	ตค 59	พย 59	ธค 59	มค 60	กพ 60	มีค 60	เมย 60	พค 60	มิย 60	กค 60	สค 60	กย 60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1 ครม. อนุมัติโครงการ	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

แผนการเบิกจ่ายเงิน

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563		
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย					
1 ค่าเวนคืนสิ่งไหมทรัพย์สิน	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.32	16.32	16.32	16.32	16.32	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00
2 ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	2.15	0.00	1.44	1.80	1.08	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 ค่าก่อสร้าง	16,704.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.47	0.00	13.53	27.06	54.12	139.75	248.00	285.65	326.19	369.00	413.30	7,472.78		5,213.86		470.98	
4 ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง	423.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.34	0.00	0.32	0.65	1.30	3.35	5.94	6.84	7.81	8.83	9.89	178.88		124.81		32.44	
แผนการเบิกจ่ายเงิน	17,249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	2.15	0.00	1.44	1,714.61	1.08	14.22	27.71	55.42	159.42	270.26	308.81	350.32	394.16	439.52	7,667.99		5,338.66		503.42	
แผนการเบิกจ่ายเงินสะสม	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	2.87	2.87	4.31	1,718.92	1,720.00	1,734.22	1,761.93	1,817.35	1,976.77	2,247.03	2,555.84	2,906.16	3,300.31	3,739.83	11,407.81		16,746.48		17,249.90	

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (เดือน)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561				ปีงบประมาณ 2562				ปีงบประมาณ 2563				ปีงบประมาณ 2564																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		คค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	คค 59	พย 59	ธค 59	มค 60	กพ 60	มีค 60	เมย 60	พค 60	มิย 60	กค 60	สค 60	กย 60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

แผนการเบิกจ่ายเงิน

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	
		คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย					
1 ค่าเวนคืนสิ่งไหมทรัพย์สิน	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	2.40	1.60	2.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 ค่าก่อสร้าง	28,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.18	0.00	14.49	28.97	57.94	151.96	267.84	300.51	335.70	373.22	7,692.64	10,297.62	5,774.10	797.66	
4 ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง	611.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.18	0.00	0.29	0.58	1.15	3.03	5.34	5.99	6.69	7.44	153.33	205.25	115.09	46.49	
แผนการเบิกจ่ายเงิน	29,667.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	2.40	1.60	2.00	2,961.57	0.00	14.77	29.55	67.10	162.98	281.18	314.50	350.39	388.66	7,853.96	10,502.87	5,889.19	844.15	
แผนการเบิกจ่ายเงินสะสม	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	3.20	4.81	6.81	2,968.38	2,968.38	2,983.15	3,012.70	3,079.79	3,242.78	3,523.96	3,838.45	4,188.84	4,577.49	12,431.46	22,934.32	28,823.51	29,667.66	

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าชวงครปฐม - หัวหิน

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน		ระยะเวลา (เดือน)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	ตค 59	พย 59	ธค 59	มค 60	กพ 60	มีค 60	เมย 60	พค 60	มิย 60	กค 60	สค 60	กย 60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	กก.วล. เห็นชอบรายงาน EIA	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

แผนการเบิกจ่ายเงิน

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563
		คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
1	ค่าเวนคืนสิ่งทรมทรัพย์	316.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.20	45.20	45.20	45.20	45.20	45.20	45.20	0.00	0.00
2	ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	2.31	1.54	1.93	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ค่าก่อสร้าง	19,370.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.03	0.00	15.69	31.38	62.76	162.05	287.58	331.23	378.24	7,994.42	7,088.46	1,081.48
4	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง	450.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.06	0.00	0.34	0.69	1.38	3.56	6.32	7.28	8.31	175.65	155.74	46.29
แผนการเบิกจ่ายเงิน		20,145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	2.31	1.54	1.93	1,983.25	0.00	16.03	77.27	109.34	210.81	339.09	383.71	431.75	8,215.26	7,244.20	1,127.77
แผนการเบิกจ่ายเงินสะสม		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	3.08	4.62	6.55	1,989.79	1,989.79	2,005.83	2,083.10	2,192.43	2,403.25	2,742.34	3,126.05	3,557.79	11,773.06	19,017.26	20,145.03

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (เดือน)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		คค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	คค 59	พย 59	ธค 59	มค 60	กพ 60	มีค 60	เมย 60	พค 60	มิย 60	กค 60	สค 60	กย 60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1 กท.วล. เห็นชอบรายงาน EIA	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

แผนการเบิกจ่ายเงิน

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564		
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย						
1	ค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	163.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	23.40	23.40	23.40	23.40	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	2.31	1.54	1.93	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ค่าก่อสร้าง	24,212.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.25	0.00	12.10	24.19	48.39	126.91	223.69	250.97	280.36	6,030.97	8,679.33	5,224.49	889.85		
4	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง	556.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.70	0.00	0.26	0.53	1.05	2.76	4.86	5.45	6.09	131.03	188.57	113.51	47.18		
แผนการเบิกจ่ายเงิน		24,940.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	2.31	1.54	1.93	2,478.10	0.00	12.36	48.12	72.84	153.06	251.94	279.82	309.85	6,185.39	8,867.90	5,338.00	937.03		
แผนการเบิกจ่ายเงินสะสม		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	3.08	4.62	6.55	2,484.65	2,484.65	2,497.01	2,545.13	2,617.97	2,771.03	3,022.97	3,302.79	3,612.64	9,798.03	18,665.93	24,003.93	24,940.96		

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (เดือน)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561				ปีงบประมาณ 2562				ปีงบประมาณ 2563			
		ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	ตค 59	พย 59	ธค 59	มค 60	กพ 60	มีค 60	เมย 60	พค 60	มิย 60	กค 60	สค 60	กย 60												
1 กท.วล. เห็นชอบรายงาน EIA	11																																				
2 ครม. อนุมัติโครงการ	5																																				
3 สำนักงานกฤษฎีกาออก พรฎ.เวนคืน	6																																				
4 สำรวจและประเมินราคา	6																																				
5 เวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	7																																				
6 จัดทำสัญญาช่วยประกวดราคา	3																																				
7 จัดทำ TOR และ ราคากลาง	3																																				
8 ประกวดราคา/ลงนามในสัญญา/ส่งมอบพื้นที่	5																																				
9 จัดทำสัญญาควบคุมงานก่อสร้าง	4																																				
10 ก่อสร้าง	30																																				

แผนการเบิกจ่ายเงิน

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
1 ค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73	4.73	23.66	0.00	0.00
2 ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	2.55	1.70	2.13	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 ค่าก่อสร้าง	9,968.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.82	0.00	11.20	22.40	44.81	114.62	4,622.49	3,937.48	218.39
4 ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง	292.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.21	0.00	0.31	0.62	1.24	3.17	127.94	108.98	20.65
แผนการเบิกจ่ายเงิน	10,301.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	2.55	1.70	2.13	1,027.31	0.00	11.51	23.02	50.78	122.52	4,774.09	4,046.46	239.04	
แผนการเบิกจ่ายเงินสะสม	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	3.40	5.10	7.23	1,034.53	1,034.53	1,046.04	1,069.07	1,119.85	1,242.37	6,016.46	10,062.91	10,301.95

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (เดือน)	ปีงบประมาณ 2559										ปีงบประมาณ 2560										ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	ตค 59	พย 59	ธค 59	มค 60	กพ 60	มีค 60	เมย 60	พค 60					มิย 60	กค 60	สค 60	กย 60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1 กท.วล. เห็นชอบรายงาน EIA	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

แผนการเบิกจ่ายเงิน

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย				
1 ค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	2,679.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.90	0.00	0.00	0.00
2 ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	2.55	1.70	2.13	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 ค่าก่อสร้าง	52,321.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134.75	0.00	25.65	7,092.06	17,105.09	15,899.63	6,090.27	
4 ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง	1,046.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.70	0.00	0.48	133.96	323.10	300.33	166.39	
แผนการเบิกจ่ายเงิน	56,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	2.55	1.70	2.13	5,238.72	0.00	26.14	9,905.92	17,428.19	16,199.96	6,256.66	
แผนการเบิกจ่ายเงินสะสม	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	3.40	5.10	7.23	5,245.94	5,245.94	5,272.08	15,178.00	32,606.19	48,806.14	55,062.80	

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าช่วนเด่นชัย - เชียงใหม่

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน		ระยะเวลา (เดือน)	ปีงบประมาณ 2559											ปีงบประมาณ 2560											ปีงบประมาณ 2561				ปีงบประมาณ 2562				ปีงบประมาณ 2563				ปีงบประมาณ 2564																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			คค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	คค 59	พย 59	ธค 59	มค 60	กพ 60	มีค 60	เมย 60	พค 60	มิย 60	กค 60	สค 60	กย 60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

แผนการเบิกจ่ายเงิน

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย				
1	ค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00
2	ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	2.55	1.70	2.13	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ค่าก่อสร้าง	57,992.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,167.81	0.00	30.82	8,518.92	20,546.48	19,098.49	7,315.58	
4	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง	1,159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.14	0.00	0.58	159.32	384.26	357.18	197.88	
แผนการเบิกจ่ายเงิน		59,916.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	2.55	1.70	2.13	6,291.22	0.00	31.39	9,434.24	20,930.74	19,455.67	7,513.46	
แผนการเบิกจ่ายเงินสะสม		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	3.40	5.10	7.23	6,298.45	6,298.45	6,329.84	15,764.08	36,694.82	56,150.50	63,663.96	

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าชานุมาน - หนองคาย

ขั้นตอนการดำเนินงาน		ระยะเวลา (เดือน)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561				ปีงบประมาณ 2562				ปีงบประมาณ 2563																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	ตค 59	พย 59	ธค 59	มค 60	กพ 60	มีค 60	เมย 60	พค 60	มิย 60	กค 60	สค 60	กย 60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
1 ค่าเวนคืนสิ่งทรมทรัพย์	699.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.70	0.00	0.00
2 ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	2.55	1.70	2.13	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 ค่าก่อสร้าง	24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.44	0.00	18.71	5,464.52	10,757.07	4,544.68	
4 ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง	569.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.27	0.00	0.42	121.28	238.75	128.00	
แผนการเบิกจ่ายเงิน	26,057.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	2.55	1.70	2.13	2,364.99	0.00	19.12	5,667.50	10,995.81	4,672.68	
แผนการเบิกจ่ายเงินสะสม	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	3.40	5.10	7.23	2,372.21	2,372.21	2,391.33	8,058.83	19,054.65	23,727.33	

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี

ขั้นตอนการดำเนินงาน		ระยะเวลา (เดือน)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561				ปีงบประมาณ 2562				ปีงบประมาณ 2563																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ปีงบประมาณ 2561				ปีงบประมาณ 2562				ปีงบประมาณ 2563																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			58	58	58	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	60	60	60	60	60	60	60	60	60	ปีงบประมาณ 2561				ปีงบประมาณ 2562				ปีงบประมาณ 2563																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	กก.วล. เห็นชอบรายงาน EIA	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
1	ค่าเวนคืนสิ่งทรมทรัพย์	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00
2	ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	2.55	1.70	2.13	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ค่าก่อสร้าง	35,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896.17	0.00	39.66	11,585.14	22,805.70	9,635.02
4	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง	702.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.92	0.00	0.75	218.83	430.77	230.96
แผนการเบิกจ่ายเงิน	35,836.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	2.55	1.70	2.13	4,995.37	0.00	40.41	11,805.67	23,236.47	9,865.98
แผนการเบิกจ่ายเงินสะสม	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	3.40	5.10	7.23	5,002.59	5,002.59	5,043.00	16,848.67	40,085.14	49,951.12

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (เดือน)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561				ปีงบประมาณ 2562				ปีงบประมาณ 2563																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	ตค 59	พย 59	ธค 59	มค 60	กพ 60	มีค 60	เมย 60	พค 60	มิย 60	กค 60	สค 60	กย 60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

แผนการเบิกจ่ายเงิน

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
1 ค่าเวนคืนสิ่งทรมทรัพย์	691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00
2 ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	2.55	1.70	2.13	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 ค่าก่อสร้าง	22,147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357.83	0.00	27.20	7,945.17	15,640.31	6,607.77	
4 ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง	531.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.16	0.00	0.51	150.08	295.43	158.39	
แผนการเบิกจ่ายเงิน	23,379.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	2.55	1.70	2.13	3,426.26	0.00	27.71	8,563.25	15,935.74	6,766.16	
แผนการเบิกจ่ายเงินสะสม	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	3.40	5.10	7.23	3,433.48	3,433.48	3,461.20	12,024.44	27,960.18	34,726.34	

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ - สงขลา

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน		ระยะเวลา (เดือน)	ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564
			ตค 59	พย 59	ธค 59	มค 60	กพ 60	มีค 60	เมย 60	พค 60	มิย 60	กค 60	สค 60	กย 60				
1	กก.วล. เห็นชอบรายงาน EIA	11																
2	กรม. อนุมัติโครงการ	5																
3	สำนักงานกฤษฎีกาออก พรฎ.เวนคืน	6																
4	สำรวจและประเมินราคา	6																
5	เวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	7																
6	จ้างที่ปรึกษาช่วยประกวดราคา	3																
7	จัดทำ TOR และ ราคากลาง	3																
8	ประกวดราคา	5																
9	จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง	4																
10	ก่อสร้าง	48																

แผนการเบิกจ่ายเงิน

รายการ		จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย				
1	ค่าเวนคืนสิ่งสาธารณทรัพย์	1,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.54	0.00	0.00	0.00
2	ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	2.55	1.70	2.13	1.28	0.00	0.00	0.00
3	ค่าก่อสร้าง	72,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,984.16	14,548.89	16,837.52	8,804.27
4	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง	1,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.17	274.81	318.04	215.48
แผนการเบิกจ่ายเงิน		75,225.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	2.55	1.70	2.13	10,059.14	14,823.70	17,155.56	9,019.75
แผนการเบิกจ่ายเงินสะสม		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	3.40	5.10	7.23	10,066.36	24,890.07	42,045.62	51,065.37

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน		ระยะเวลา (เดือน)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561					ปีงบประมาณ 2562				
			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย										
			58	58	58	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	60	60	60	60	60	60	60	60	60										
1	กค.วล. เห็นชอบรายงาน EIA	11																																		
2	ครม. อนุมัติโครงการ	5																																		
3	สำนักงานกฤษฎีกาออก พรฎ.เวนคืน	6																																		
4	สำรวจและประเมินราคา	6																																		
5	เวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	7																																		
6	จ้างที่ปรึกษาช่วยประกวดราคา	3																																		
7	จัดทำ TOR และ ราคากลาง	3																																		
8	ประกวดราคา	5																																		
9	จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง	4																																		
10	ก่อสร้าง	24																																		

แผนการเบิกจ่ายเงิน

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
1 ค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.70	0.00
2 ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	2.55	1.70	2.13	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 ค่าก่อสร้าง	7,651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.44	0.00	39.57	11,271.58	9,473.82	
4 ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.27	0.00	0.88	250.17	237.40	
แผนการเบิกจ่ายเงิน	7,940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	2.55	1.70	2.13	2,364.99	0.00	40.45	11,603.45	9,711.22	
แผนการเบิกจ่ายเงินสะสม	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	3.40	5.10	7.23	2,372.21	2,372.21	2,412.66	14,016.11	23,727.33	

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน
โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายสุราษฎร์ธานี - พังงา - ทาปูน

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (เดือน)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561				ปีงบประมาณ 2562				ปีงบประมาณ 2563																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	ตค 59	พย 59	ธค 59	มค 60	กพ 60	มีค 60	เมย 60	พค 60	มิย 60	กค 60	สค 60	กย 60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

แผนการเบิกจ่ายเงิน

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
1 ค่าเวนคืนสิ่งทรมทรัพย์	601.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.12	0.00	0.00
2 ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	2.55	1.70	2.13	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 ค่าก่อสร้าง	23,965.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.52	0.00	19.41	5,670.56	11,162.67	4,716.04
4 ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง	563.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.12	0.00	0.42	123.18	242.48	130.00
แผนการเบิกจ่ายเงิน	25,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	2.55	1.70	2.13	2,452.92	0.00	19.83	6,394.86	11,405.15	4,846.04
แผนการเบิกจ่ายเงินสะสม	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	3.40	5.10	7.23	2,460.14	2,460.14	2,479.97	8,874.83	20,279.98	25,126.02

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน
โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

แผนการดำเนินงาน		ปีงบประมาณ 2559														ปีงบประมาณ 2560														ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (เดือน)	ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	ตค 59	พย 59	ธค 59	มค 60	กพ 60	มีค 60	เมย 60	พค 60	มิย 60	กค 60	สค 60	กย 60									
1	ก.ว.ล. เห็นชอบรายงาน EIA																																	
2	ครม. อนุมัติโครงการ																																	
3	สำนักงานกฤษฎีกาออก พญ.เวนคืน																																	
4	จัดจ้างที่ปรึกษาช่วยเวนคืนที่ดิน																																	
5	สำรวจและประเมินราคา																																	
6	เวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง																																	
7	จ้างที่ปรึกษาช่วยประกวดราคา																																	
8	จัดทำ TOR และ วาากลาง																																	
9	ประกวดราคา																																	
10	จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง																																	
11	ก่อสร้าง																																	

รายการ		จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย					
1	ค่าจ้างที่ปรึกษาช่วยเวนคืนที่ดิน	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48	0.00	6.48	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ค่าเวนคืนสิ่งทวืมหรียญ	3,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00	
3	ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	2.00	2.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	ค่าก่อสร้าง	71,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,098.74	21,212.01	24,548.79	12,836.46	
5	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง	1,433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.39	400.67	463.70	314.16	
แผนการเบิกจ่ายเงิน		76,980.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	2.00	2.50	7.98	0.00	6.48	6.48	6.48	1,910.48	15,258.13	21,612.68	25,012.49	13,150.62	
แผนการเบิกจ่ายเงินสะสม		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	6.00	8.50	16.48	16.48	22.96	29.44	35.92	1,946.40	17,204.53	38,817.21	63,829.70	76,980.32	

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน
โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม

ขั้นตอนการดำเนินงาน		ระยะเวลา (เดือน)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565					
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	ตค 59	พย 59	ธค 59	มค 60	กพ 60	มีค 60	เมย 60	พค 60	มิย 60	กค 60	สค 60	กย 60										
1	ก.ล.ว. เห็นชอบรายงาน EIA	24																																		
2	ครม. อนุมัติโครงการ	5																																		
3	สำนักงานกฤษฎีกาออก พญ.เวนคืน	6																																		
4	จัดจ้างที่ปรึกษาช่วยเวนคืนที่ดิน	3																																		
5	สำรวจและประเมินราคา	6																																		
6	เวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	24																																		
7	จ้างที่ปรึกษาช่วยประกวดราคา	3																																		
8	จัดทำ TOR และ ราคากลาง	3																																		
9	ประกวดราคา	5																																		
10	จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง	4																																		
11	ก่อสร้าง	48																																		

รายการ		จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปีงบประมาณ 2559												ปีงบประมาณ 2560												ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย						
1	ค่าจ้างที่ปรึกษาช่วยเวนคืนที่ดิน	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	0.00	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ค่าเวนคืนสิ่งสัมพัทธ์	4,529.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.91	2,264.91	0.00	0.00	0.00	
3	ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	2.00	2.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	ค่าก่อสร้าง	54,684.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.75	16,178.95	18,724.00	9,790.70	
5	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง	1,093.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.79	305.60	353.68	239.62	
แผนการเบิกจ่ายเงิน		60,353.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	2.00	2.50	8.60	0.00	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	2,272.01	12,450.45	16,484.56	19,077.67	10,030.32	
แผนการเบิกจ่ายเงินสะสม		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	6.00	8.50	17.10	17.10	24.20	31.30	38.40	2,310.41	14,760.86	31,245.41	50,323.09	60,353.41			

แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน
โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง - ท่าเทียบเรือทวาย

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน		ระยะเวลา (เดือน)	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2560	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567
1	จัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด	4									
2	ออกแบบรายละเอียด	12									
3	กก.วล. เห็นชอบรายงาน EIA	12									
4	กรม. อนุมัติโครงการ	5									
5	สำนักงานกฤษฎีกาออก พรฎ.เวนคืน	8									
6	จัดจ้างที่ปรึกษาช่วยเวนคืนที่ดิน	3									
7	สำรวจและประเมินราคา	5									
8	เวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	24									
9	จ้างที่ปรึกษาช่วยประกวดราคา	3									
10	จัดทำ TOR และ ราคากลาง	3									
11	ประกวดราคา	5									
12	จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง	4									
13	ก่อสร้าง	48									

แผนการเบิกจ่ายเงิน

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2560	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567
1 ค่าจ้างที่ปรึกษาช่วยเวนคืนที่ดิน	45.50	0.00	0.00	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 ค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	11,967.22	0.00	0.00	0.00	3,490.44	5,983.61	2,493.17	0.00	0.00	0.00
3 ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 ค่าก่อสร้าง	72,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,512.17	15,568.51	25,863.62	17,971.73	4,234.97
5 ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง	1,443.02	0.00	0.00	0.00	0.00	168.80	294.07	488.54	339.47	152.14
แผนการเบิกจ่ายเงิน	85,616.74	0.00	0.00	0.00	3,545.94	14,664.59	18,355.75	26,352.15	18,311.20	4,387.11
แผนการเบิกจ่ายเงินสะสม	-	0.00	0.00	0.00	3,545.94	18,210.53	36,566.27	62,918.43	81,229.63	85,616.74

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สถาบันบัญญัติแห่งชาติ
ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา

เวลา ๑๓.๑๕ น.

เวลา ๑๓.๓๐ น.

เวลา ๑๔.๐๐ น.

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

เวลา ๑๖.๐๐ น.

เวลา ๑๖.๓๐ น.

- คณะเดินทางพร้อมกันหน้าอาคารรัฐสภา ๒
 - ออกเดินทางไปยัง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
(โดยรถตู้ปรับอากาศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)
 - เดินทางถึง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 - รับฟังบรรยายสรุปจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
และคณะผู้บริหารของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลการวางแผนการขาย
และกลยุทธ์การแข่งขันทางด้านตลาดการบินของ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
 - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 - คณะกรรมการเดินทางกลับอาคารรัฐสภา ๒
 - คณะกรรมการเดินทางถึงอาคารรัฐสภา ๒
-

แบบแสดงความประสงค์
ในการเดินทางไปศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....

ตำแหน่ง

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

e-mail.....

มีความประสงค์ ดังนี้

- ☐ เดินทางไปศึกษาดูงาน
- ☐ โดยรถตู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (รถออกเวลา ๑๓.๓๐ น.)
- ☐ นำรถไปเอง ทะเบียนรถ.....
- ☐ ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาดูงาน

.....

(.....)

ผู้แสดงความประสงค์

หมายเหตุ โปรดส่งแบบแสดงความประสงค์ไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
สำนักกรรมการ ๑ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๕ - ๕ / โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๕) ภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
*** ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
